


TÄGLICHER ABC-TEST
TESTBOGEN FÜR 50 BETRIEBSTAGE

Wenn o.k. ✓	Geprüft			Name Prüfer Unterschrift
	A	B	C	
Datum				

- A) Laufruhe und Augenschein:**
Anlage muss ruhig laufen. Das leere Seil darf den Boden nicht berühren. Bei Bedarf spannen. Seil darf nicht beschädigt sein. Seilhöhe und Gelände bei Einstieg und Ausstieg richten. Keine Gefahr für unkundige Skiläufer.
- B) Kein Seildrall** beim leerlaufenden Lift, Haltegriffe beobachten. maximal drei Umdrehungen pro Bergfahrt sind erlaubt. Drall kommt vom schiefen Auflauf des Seiles auf die Räder. Behebung siehe Betriebsanleitung.
- C) Test der Überfahrtsicherung** Berg Einlauf, wenn vorhanden Tal Einlauf. Betätigungskraft max. 5 kg (50 N). Muss nach 8 cm Weg schalten und muss sich ganz zusammenschieben lassen (ca. 1,2 m). Funktionstest aller installierten **AUS-Taster**.

Elektrische Probleme?
Zuerst immer Kurz- und Erdschlussüberwachung d3 testen.

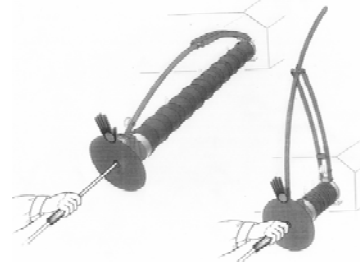

Aufgetretene Probleme:

Datum:

Wenn o.k. ✓	Geprüft			Name Prüfer Unterschrift
	A	B	C	
Datum				
